


UD2. Metodologías de proyectos

Teórico-Práctica

Estudio de metodologías de gestión de proyectos (ágiles, tradicionales y híbridas), roles, reuniones, planificación y control del progreso.

1. Introducción

La gestión de proyectos es la disciplina que permite organizar, coordinar y controlar los recursos, tiempos, riesgos y entregables necesarios para alcanzar un objetivo concreto. En la práctica, cada proyecto tiene características distintas y requiere una metodología apropiada a su contexto, complejidad, incertidumbre y urgencia.

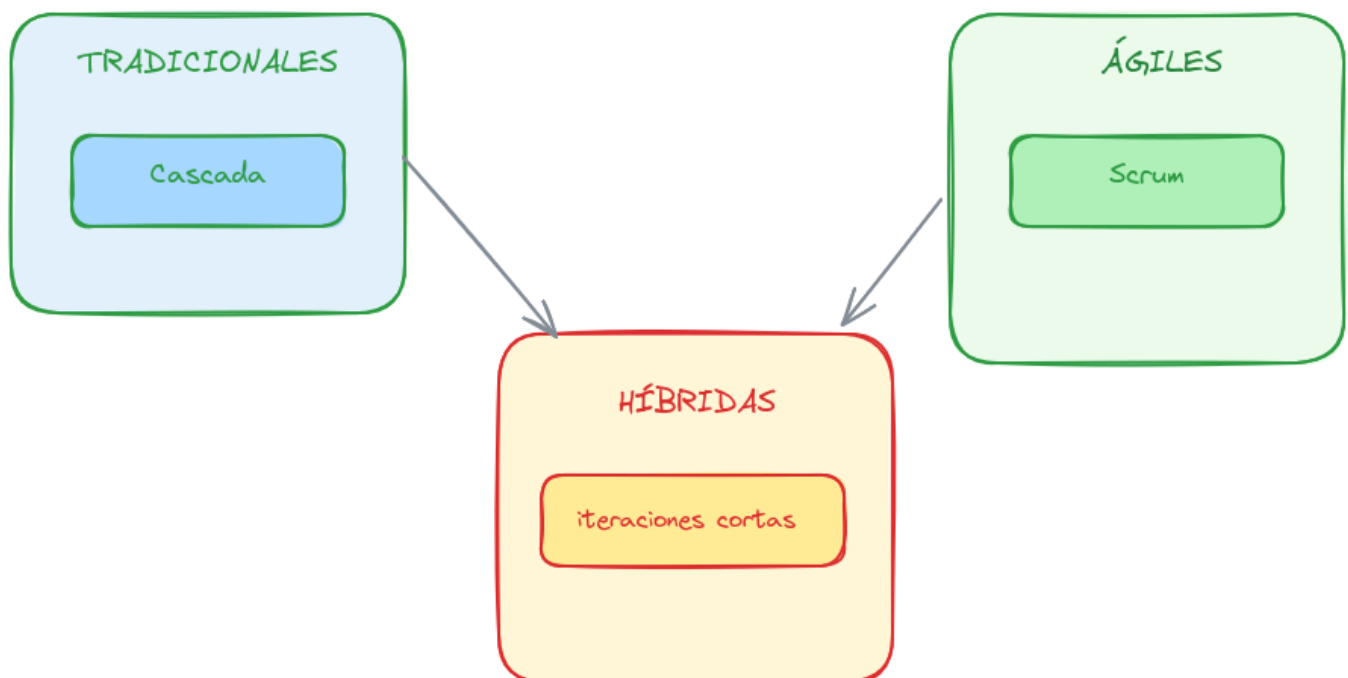


A lo largo de la historia, dos grandes enfoques han predominado:

- Metodologías tradicionales o predictivas
- Metodologías ágiles o adaptativas

Además, en la actualidad muchas organizaciones utilizan modelos híbridos que combinan elementos de ambos enfoques para equilibrar planificación, flexibilidad y control.

Predecible (todo antes de nada) vs. Adaptable (feedback rápido)

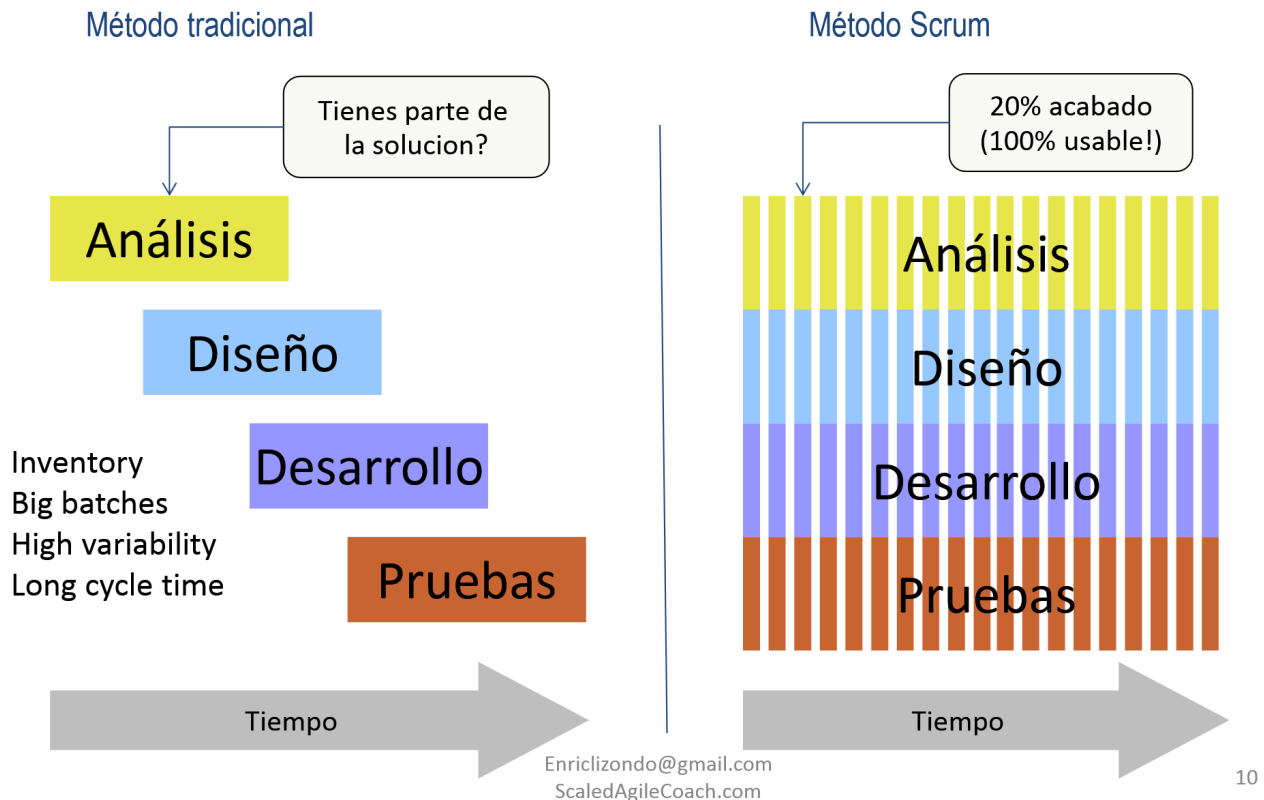


10

2. Metodologías tradicionales

Las metodologías tradicionales, también llamadas secuenciales o predictivas, se basan en una planificación inicial exhaustiva y en una ejecución ordenada de fases. Su punto fuerte es la previsibilidad y el control de alcance, coste y tiempos cuando los requisitos son conocidos desde el principio.

2.1. Modelo en cascada

El modelo en cascada divide el proyecto en fases consecutivas y cada etapa se encadena con la siguiente mediante una secuencia lógica y progresiva.

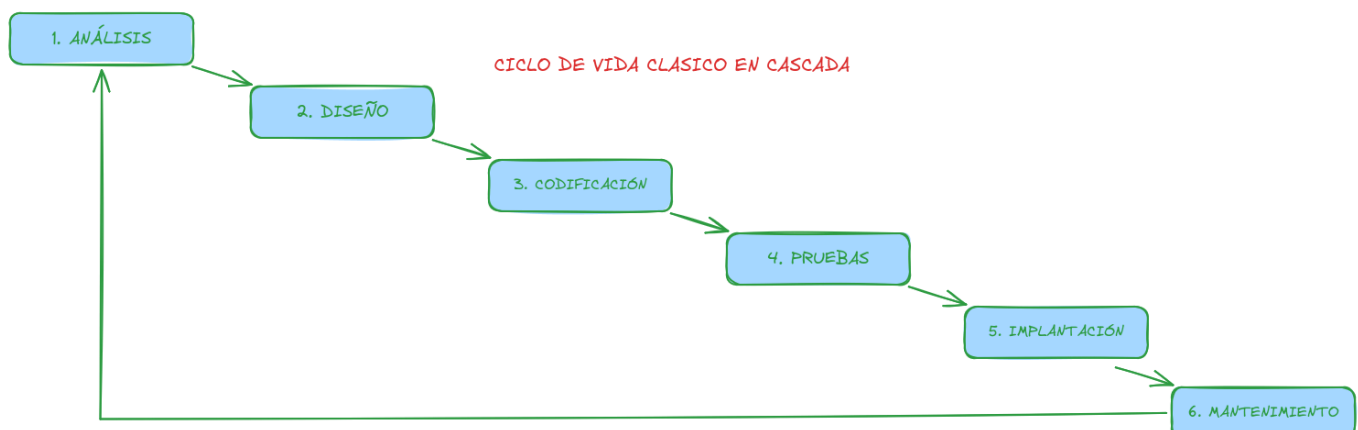

1. Análisis de requisitos
2. Diseño
3. Implementación
4. Pruebas
5. Implantación
6. Mantenimiento

Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Es útil cuando el proyecto es estable, el alcance está bien definido y los cambios son muy costosos.

2.2. Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- Planificación detallada desde el inicio
- Documentación clara y estructurada
- Fácil trazabilidad de decisiones
- Adecuado para proyectos con requisitos estables

Limitaciones:

- Poca flexibilidad ante cambios
- Dificultad para responder a requisitos no previstos
- Riesgo alto si se detectan errores tarde
- El cliente ve resultados solo al final

3. Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles surgieron como respuesta a entornos de cambio constante y alta incertidumbre. Priorizan la entrega incremental, la colaboración con el cliente y la posibilidad de ajustar el plan durante el proyecto.

3.1. Principios ágiles

Los principios del enfoque ágil se centran en:

- Entregar valor de forma incremental
- Responder a cambios en lugar de seguir un plan rígido
- Fomentar la comunicación continua
- Trabajar con equipos autoorganizados
- Revisar y ajustar el producto de forma frecuente

3.2. Scrum

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas. Se organiza en iteraciones llamadas sprints, normalmente de 1 a 4 semanas, y se centra en entregas funcionales y revisiones periódicas.

En un proyecto de ASIR enfocado en DevOps y SysAdmin, Scrum puede servir para gestionar tareas como desplegar servicios, automatizar copias de seguridad, instalar servidores, documentar infraestructura,

corregir incidencias o preparar entornos de pruebas. El equipo no trabaja solo con código, sino también con configuración, automatización y mantenimiento de sistemas.

Las herramientas más habituales para coordinar este tipo de trabajo son Trello y Jira:

- Trello: ayuda a visualizar tareas en tableros tipo Kanban, ideal para asignar trabajos rápidos, incidencias y seguimiento de tareas diarias.
- Jira: es muy útil para gestionar historias de usuario, sprints, backlog, incidencias y métricas de entrega en equipos con más estructura de proyecto.




Roles clave en Scrum y su función principal

Rol	Función principal
Product Owner	Define la prioridad del producto y representa las necesidades del cliente o del usuario final.
Scrum Master	Facilita el proceso, elimina bloqueos y ayuda al equipo a seguir la metodología sin perder calidad ni ritmo.
Development Team	Diseña, implementa, prueba y entrega la solución, incluyendo automatización, despliegues y configuración.

En un proyecto de DevOps/SysAdmin, el Development Team puede incluir roles concretos como administrador de sistemas, analista de redes, desarrollador de automatización, responsable de despliegue y soporte técnico. Aunque la responsabilidad es compartida, cada miembro aporta especialización distinta al servicio.

Modelo ágil frente a modelo tradicional

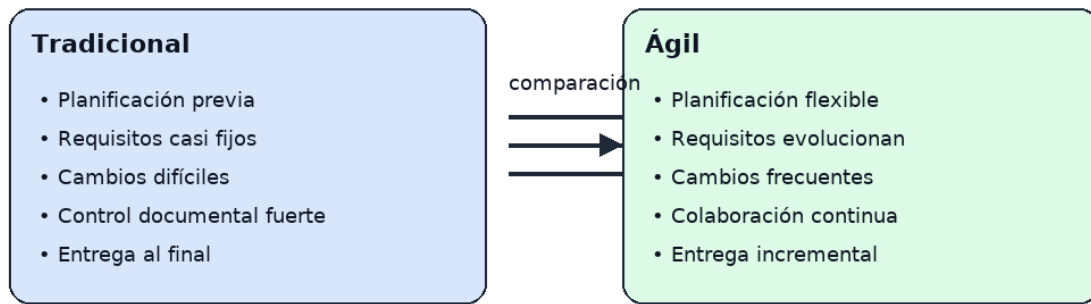

Artefactos principales

- Product Backlog: lista priorizada de requisitos y mejoras.
- Sprint Backlog: trabajo seleccionado para el sprint.
- Increment: resultado usable al final del sprint.

Reuniones clave en Scrum

- Sprint Planning: planifica el trabajo del siguiente sprint.
- Daily Scrum: reunión breve diaria para sincronizar el equipo.
- Sprint Review: se presenta el trabajo realizado y se recibe feedback.
- Sprint Retrospective: análisis de lo que ha funcionado y cómo mejorar.

3.3. Kanban

Kanban se basa en visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero con columnas como “Por hacer”, “En proceso” y “Hecho”. Se centra en limitar el trabajo en curso y mejorar el flujo continuo de entrega.

3.4. Ventajas y limitaciones de Agile

Ventajas:

- Flexibilidad ante cambios
- Mayor colaboración y adaptabilidad
- Entregas frecuentes de valor
- Mejora continua

Limitaciones:

- Requiere implicación constante del cliente
- Puede resultar caótico sin disciplina y gobernanza
- No siempre es adecuado para proyectos altamente regulados

4. Metodologías híbridas

Las metodologías híbridas mezclan elementos de planificación tradicional y enfoques ágiles. Se utilizan cuando el proyecto tiene parte de requisitos estables y otra parte cambiante, o cuando la organización

necesita control documental junto a entregas iterativas.

4.1. ¿Cuándo conviene una metodología híbrida?

Es recomendable en proyectos donde:

- Hay regulación o auditoría externa
- Existen requisitos fijos y otros emergentes
- Se requiere documentación formal, pero también rapidez de entrega
- El equipo necesita combinar gobernanza con innovación

4.2. Ejemplo de enfoque híbrido

Un proyecto puede usar:

- una planificación inicial del alcance y presupuesto,
- entregas iterativas por sprints,
- reuniones de revisión periódicas,
- control de riesgos y documentación formal,
- y adaptación continua según el feedback del cliente.

5. Roles en la gestión de proyectos

Aunque cada metodología define roles distintos, algunas funciones son comunes en casi cualquier proyecto.

5.1. Roles principales

- Director/a de proyecto: supervisa objetivos, alcance, cronograma y riesgos.
- Jefe de equipo / coordinador: organiza tareas y recursos del equipo.
- Analista / responsable de requisitos: recoge necesidades y prioriza funcionalidad.
- Desarrollador/a: diseña y construye la solución.
- Tester / QA: valida la calidad y la corrección del producto.
- Cliente / stakeholder: aporta necesidades, validación y feedback.
- DevOps / SysAdmin: automatiza despliegues, gestiona infraestructura, monitorización, seguridad y mantenimiento del entorno.

En un proyecto de ASIR con enfoque DevOps y administración de sistemas, el rol de SysAdmin no es solo “instalar servicios”, sino también garantizar disponibilidad, escalabilidad, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante fallos. El rol de DevOps conecta desarrollo e infraestructura para automatizar despliegues y reducir errores manuales.

5.2. Importancia del papel del equipo

El éxito de un proyecto depende no solo de la planificación, sino también de la comunicación, la motivación y la colaboración dentro del equipo. Los roles deben estar definidos, pero también es necesario fomentar la cooperación y la responsabilidad compartida.

6. Reuniones y comunicación

Las reuniones son un elemento clave para la coordinación del proyecto. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones, compartir avances y detectar riesgos a tiempo.

6.1. Tipos de reuniones

- Reunión inicial o kickoff: presenta objetivos, alcance, responsabilidades y cronograma.
- Reunión de seguimiento: revisa avances, bloqueos y próximos pasos.
- Reunión de planificación: define tareas, prioridades y plazos.
- Reunión de revisión: valida el progreso con el cliente o stakeholders.
- Reunión de retrospectiva: identifica mejoras para el próximo ciclo.

6.2. Buenas prácticas

- Mantener reuniones con objetivos claros
 - Limitar la duración y el número de asistentes
 - Registrar decisiones y compromisos
 - Asegurar la participación de todos los implicados
 - Documentar riesgos y acciones pendientes
-

7. Planificación del proyecto

La planificación es la base de la gestión de proyectos. Consiste en definir qué se hará, quién lo hará, cuándo y con qué recursos.

7.1. Elementos clave de la planificación

- Objetivos y alcance
- Tareas y dependencias
- Duración estimada
- Recursos humanos y materiales
- Presupuesto
- Riesgos
- Calendario y hitos

7.2. Técnicas de planificación

Algunas técnicas habituales son:

- Diagrama de Gantt
- Diagrama de precedencias o PERT
- WBS (Work Breakdown Structure)
- Historias de usuario y backlog en metodologías ágiles
- Estimaciones por puntos de historia o por tiempos

La planificación debe adaptarse al tipo de proyecto. En entornos estables, un plan detallado puede ser más útil; en entornos inciertos, conviene una planificación adaptable y revisable.



8. Control del progreso

El control del progreso consiste en comparar el plan previsto con la ejecución real y detectar desviaciones. Es fundamental para corregir problemas antes de que se conviertan en riesgos graves.

8.1. Indicadores de seguimiento

- Avance frente al plan
- Tiempo gastado y tiempo previsto
- Coste real y coste estimado
- Calidad de entregables
- Riesgos activos y mitigados
- Cumplimiento de hitos

8.2. Herramientas de control

- Tableros de seguimiento
- Informes de estado
- Métricas de productividad
- Gráficos de avance
- Revisión de riesgos y dependencias

8.3. Corrección de desviaciones

Cuando el proyecto se desvía, es necesario actuar con rapidez:

- Repriorizar tareas
- Redefinir alcance o tiempos
- Asignar más recursos
- Reducir riesgos
- Comunicar cambios a los stakeholders

9. Comparativa entre metodologías

Enfoque	Características principales	Cuándo conviene
Tradicional	Planificación previa, fases secuenciales, control fuerte	Requisitos estables y poco cambio
Ágil	Iteraciones, entrega incremental, colaboración continua	Entornos dinámicos y cambiantes
Híbrida	Mezcla de planificación y flexibilidad	Proyectos con requisitos mixtos

La elección de la metodología depende del contexto, del nivel de incertidumbre, de la necesidad de control y de la forma en que el cliente quiere participar en el proyecto.

10. Conclusión

La gestión de proyectos no se basa en una única fórmula válida para todos los casos. Cada metodología ofrece ventajas y limitaciones en función de la naturaleza del trabajo, la complejidad del producto y el grado de incertidumbre.

- Las metodologías tradicionales destacan por su control y previsibilidad.
- Las metodologías ágiles se adaptan mejor a entornos cambiantes.
- Las metodologías híbridas buscan equilibrar estructura y flexibilidad.

En cualquier caso, el éxito del proyecto depende de una buena comunicación, una planificación adecuada, un liderazgo claro y un seguimiento constante del progreso. La capacidad de adaptar la metodología al proyecto es, hoy en día, una competencia esencial para cualquier profesional de la gestión.

11. Bibliografía recomendada

- Agile Manifesto. (2001).
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2017). El Guía Scrum.
- PMI. (2021). Guía del PMBOK.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

12. Actividad de reflexión

1. Compara una metodología tradicional y una ágil en un caso práctico de desarrollo de software.

2. Explica qué papel tiene el Product Owner y el Scrum Master en un proyecto Scrum.
3. Describe cómo se planifica un sprint y qué indicadores permiten controlar su progreso.
4. Analiza cuándo es más adecuado un enfoque híbrido en lugar de uno puro.
